

**NOMES: ENZO GUILHERME JANZ FRAINER, GABRIEL BALIN
CABRAL, JULIO CESAR HEINZEN, VINICIUS DOS REIS
TURMA: DS 302**


SEMANA 1

Escopo do projeto

O escopo deste projeto consiste no desenvolvimento do sistema web de gestão financeira Corta Aí, com o objetivo de oferecer uma plataforma funcional que auxilia os usuários na organização e no controle de suas finanças. O projeto abrange todas as etapas necessárias para sua construção, desde a análise inicial dos requisitos até a entrega final, incluindo planejamento, modelagem UML, desenvolvimento do banco de dados, criação da interface, realização de testes e documentação.

Entre as funcionalidades previstas estão o cadastro e login de usuários, o registro de entradas e saídas financeiras, o acompanhamento dos gastos e a definição de metas financeiras. Além disso, o sistema será desenvolvido com foco na segurança das informações dos usuários, mantendo uma identidade visual padronizada e compatibilidade com os principais navegadores.

Por outro lado, algumas funcionalidades mais avançadas não fazem parte da versão inicial do projeto, como relatórios detalhados, sistemas de notificações e recursos mais complexos de análise financeira, podendo ser implementados futuramente como melhorias do sistema.

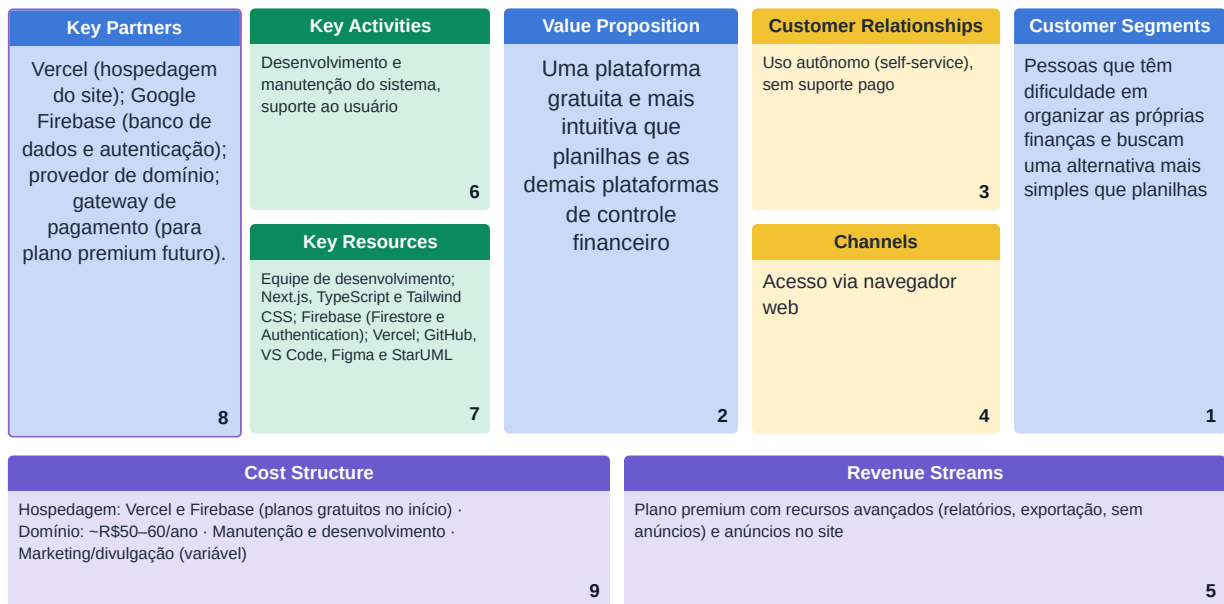

Análise de Mercado – TAM, SAM e SOM

O mercado do Corta Aí foi dimensionado em três camadas. O TAM equivale a 168,7 milhões de usuários de internet no Brasil (IBGE, 2026). O SAM considera os 48% que ainda controlam as finanças com anotações ou planilhas (Lina Open X/MindMiners, 2026), cerca de 81 milhões de pessoas. O SOM, meta realista para o primeiro ano com divulgação majoritariamente orgânica, é de aproximadamente 5 mil usuários.

Referências

IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) – Tecnologia da Informação e Comunicação, 2025*. Divulgada em 02/07/2026.

LINA OPEN X; MINDMINERS. *Do PIX ao planejamento financeiro: como a tecnologia está mudando nossa relação com o dinheiro*. 2026. tecnologia está mudando nossa relação com o dinheiro. 2026.

SEMANA 2

Análise de Negócio e Backlog do Produto

O Corta Aí atende pessoas que têm dificuldade em organizar as próprias finanças e que hoje usam anotações ou planilhas, público que representa cerca de 48% dos brasileiros conectados, conforme a análise de mercado da Semana 1. A proposta de valor é oferecer uma plataforma gratuita e mais intuitiva do que as planilhas, em que o usuário registra manualmente suas entradas e saídas, acompanha o saldo e define metas, sem integração bancária. A receita futura virá de um plano premium com recursos avançados, que por isso ficam fora da versão inicial.

A partir dos requisitos funcionais (RF-01 a RF-05) e não funcionais (RNF-01 a RNF-06), o backlog do produto foi organizado em histórias de usuário (HU) e tarefas técnicas (T), no formato “Como usuário, quero... para...”:

ID	Item do backlog	Prioridade	SP	Sprint
T1	Protótipo das telas no Figma e modelagem UML	Must	5	1
T2	Banco de dados MySQL e API em PHP	Must	8	1
T3	Estrutura do front-end: Next.js, Tailwind, layout responsivo e componentes	Must	8	2
HU01	Como visitante, quero criar uma conta, para acessar o sistema (RF-01)	Must	5	2
HU02	Como usuário, quero entrar e sair com e-mail e senha, para acessar só os meus dados (RF-02, RNF-02)	Must	5	3
HU03	Como usuário, quero registrar entradas e sua origem, para controlar minhas receitas (RF-03)	Must	5	3
HU04	Como usuário, quero registrar saídas e sua categoria, para acompanhar minhas despesas (RF-04)	Must	3	3
HU05	Como usuário, quero editar e excluir movimentações, para corrigir erros	Must	3	3
HU06	Como usuário, quero ver meu saldo e o resumo do mês, para entender minha situação	Must	8	4
HU07	Como usuário, quero consultar o histórico com filtros, para encontrar movimentações antigas	Should	5	4
HU08	Como usuário, quero criar minhas próprias categorias, para organizar do meu jeito	Should	3	4
HU09	Como usuário, quero definir metas com valor e prazo, para planejar minhas economias (RF-05)	Must	5	5
HU10	Como usuário, quero guardar dinheiro na meta e ver o progresso, para saber quanto falta (RF-05)	Must	5	5
HU11	Como usuário, quero editar meu perfil e trocar a senha, para manter a conta segura	Should	3	5

ID	Item do backlog	Prioridade	SP	Sprint
HU12	Como usuário, quero recuperar minha senha, para voltar a acessar se eu esquecer	Could	3	5
HU13	Como visitante, quero uma página inicial que explique o sistema, para decidir se vou usar	Could	3	2
HU14	Como usuário, quero gráficos simples de entradas x saídas, para visualizar meus gastos	Should	8	6
HU15	Como visitante, quero uma conta de demonstração, para conhecer o sistema sem me cadastrar	Could	2	6
T4	Testes, avaliação com usuários e documentação	Must	5	6

Matriz de Prioridades MoSCoW

Must have (obrigatório)	Should have (importante)	Could have (desejável)	Won't have (fora desta versão)
Cadastro e login (HU01, HU02)	Histórico com filtros (HU07)	Recuperar senha (HU12)	Relatórios avançados e exportação (plano premium)
Registro de entradas e saídas (HU03 a HU05)	Categorias personalizadas (HU08)	Página inicial (HU13)	Notificações e lembretes
Saldo e resumo do mês (HU06)	Editar perfil e senha (HU11)	Conta de demonstração (HU15)	Integração com bancos
Metas financeiras (HU09, HU10)	Gráficos simples (HU14)		Aplicativo mobile nativo
Protótipo, banco, API, front-end e testes (T1 a T4)			

Os itens **Must** cobrem todos os requisitos funcionais e a segurança dos dados, sem eles o sistema não cumpre sua proposta. Os itens **Could** são os primeiros a sair caso uma sprint atrase. Os itens **Won't** seguem o escopo definido na Semana 1 e ficam como melhorias futuras.

Planejamento das Sprints (Semanal)

O desenvolvimento foi dividido em **6 sprints de uma semana**. No início de cada semana a equipe escolhe os itens da sprint (*planning*), acompanha o andamento pelo grupo da equipe no WhatsApp (*daily*) e, no fim da semana, apresenta o que ficou pronto e discute melhorias (*review e retrospectiva*).

Sprint	Objetivo da semana	Itens	SP
1	Protótipo, modelagem e banco de dados prontos	T1, T2	13
2	Estrutura do site, página inicial e cadastro	T3, HU01, HU13	16

Sprint	Objetivo da semana	Itens	SP
3	Login e registro de entradas e saídas funcionando	HU02, HU03, HU04, HU05	16
4	Painel com saldo, histórico e categorias	HU06, HU07, HU08	16
5	Metas financeiras e perfil do usuário	HU09, HU10, HU11, HU12	16
6	Gráficos, testes, documentação e entrega final	HU14, HU15, T4	15
	Total		92

Story Points

Os *story points* (SP) medem o tamanho de cada item em relação aos outros, considerando complexidade, esforço e incerteza, e não em horas. A equipe usou a sequência de **Fibonacci** (1, 2, 3, 5, 8, 13) e estimou com o **Planning Poker**: cada integrante escolhe uma carta em segredo, todos revelam juntos e, se houver diferença, quem deu o maior e o menor valor explica o motivo até chegar a um consenso.

Pontos	Tamanho	Exemplo
2	Pequeno	Conta de demonstração (HU15)
3	Médio	Registrar saídas (HU04), reaproveita o formulário de entradas
5	Grande	Cadastro de usuário (HU01), com validações e banco de dados
8	Muito grande	Painel com saldo e resumo do mês (HU06)
13	Enorme	Deve ser dividido em itens menores

O backlog soma **92 story points**. Com 6 sprints, a velocidade planejada da equipe é de cerca de **15 pontos por semana**.
